

Informe mensual

Juny 2017

infraestructures.cat



 Generalitat
de Catalunya

Eix Transversal (enllaç N-II)

Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

14 obres de carreteres en execució per un import de 25 M €(IVA inclòs)

Nova carretera. Calçada lateral a la C-31 sentit Barcelona, del PK 212+650 al 213+800. Fase 1 (trams 2 i 3). Tram: Badalona.

Pressupost d'adjudicació: 2.301.769,46 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 12 de maig de 2017

Data prevista de finalització: 12 de febrer de 2018

Realització de cates, localització de SSAA i inici cobriment restes romanes Baetulo. Pendent d'iniciar les demolicions dels edificis afectats per part de l'ajuntament i cessió de terrenys, a data 13 de juny



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat


14 obres de carreteres en execució per un import de 25 M €(IVA inclòs)

Ordenació d'accessos a l'L-313 entre Guissona i Oliola

Pressupost d'adjudicació: 472.522,38 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 29 de maig de 2017

Data prevista de finalització: 29 de novembre de 2017

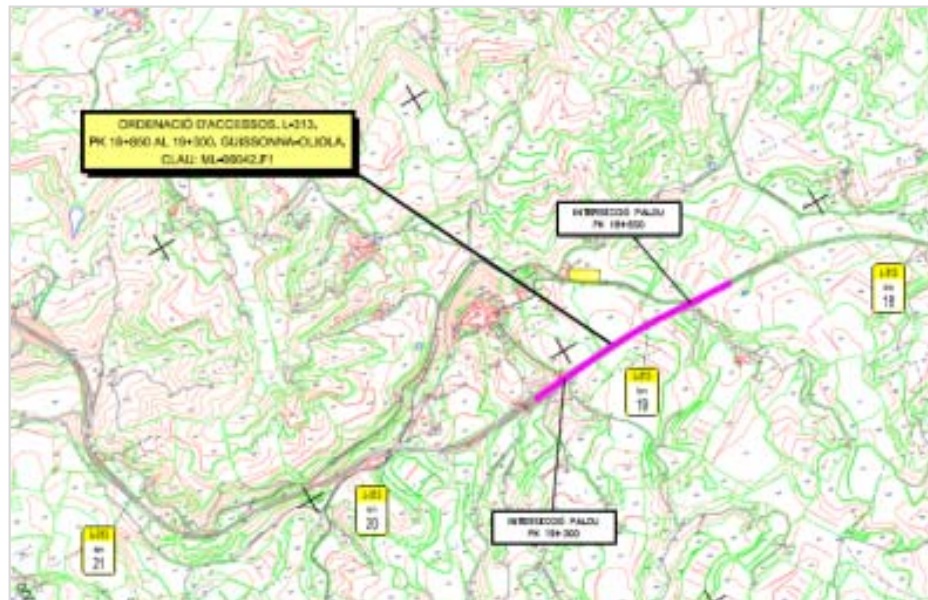

Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

11 obres de FGC en execució per un import de 62 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Superestructura de via i catenària. Tram: Plaça Major-Plaça Espanya

Pressupost d'adjudicació: 9.045.683,00€ (IVA exclòs)

Data d'inici: 15 d'octubre de 2015

Data de finalització: 30 de maig de 2017

Connexió de la catenària del Perllongament amb la línia de proves en servei i entrada del primer tren de FGC a data 7 de juny de 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

11 obres de FGC en execució per un import de 62 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Superestructura de via i catenària. Tram: Plaça Espanya-Cotxeres

Pressupost d'adjudicació: 7.374.968,10 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 1 de febrer de 2016

Data de finalització: 30 de maig de 2017

Connexió de la catenària del Perllongament amb la línia de proves en servei i entrada del primer tren de FGC a data 7 de juny de 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

11 obres de FGC en execució per un import de 62 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Arquitectura i instal·lacions de les estacions Eix Macià i Plaça Espanya

Pressupost d'adjudicació: 13.677.391,70 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 17 de novembre de 2015

Data prevista de finalització: 22 de juliol de 2017

Finalització arquitectura andana Estació Sabadell Nord a data 6 juny 2017

Finalització arquitectura ascensor andana Estació Creu Alta a data 8 juny 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

11 obres de FGC en execució per un import de 62 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Arquitectura i instal·lacions de l'estació Ca N'Oriach i de les cotxeres

Pressupost d'adjudicació: 13.677.391,70 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 d'abril de 2016

Data prevista de finalització: 22 de juliol de 2017

Finalització arquitectura de l'escala accés a vestíbul Estació Sabadell Parc del Nord a data 6 de juny de 2017

Finalització arquitectura andana costat Castellar a data 7 juny de 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 5 M€(IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte de nova estació d'autobusos de Mollerussa

Pressupost d'adjudicació: 720.785,16 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 d'abril de 2017

Data prevista de finalització: 18 d'octubre de 2017

Finalització esbossada i preparació de base a data 2 de juny de 2017

Inici mur de tancament costat vies a data 5 juny 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 5 M€(IVA inclòs)

Execució de les obres d'aparcament de turismes per suport a la nova llançadora d'autobusos a l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa

Pressupost d'adjudicació: 222.279,99 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 14 de febrer de 2017

Data prevista de finalització: 31 de juliol de 2017

Finalització de la instal·lació de l'enllumenat a data 25 de maig de 2017



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament

16 obres en execució per un import de 64 M€(IVA inclòs)

7 RAM's any 2016 en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Ensenyament 2017

➤ Import total estimat d'execució d'obres: 8.340.000 € (IVA exclòs)

➤ Previsió nombre total de centres: 82 repartits en 70 projectes

- 2 projectes en redacció
- 1 projectes pendents d'aprovació
- 35 obres en licitació
- 32 obres adjudicades



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut


11 Obres en execució per un import de 36 M€(IVA inclòs)

Nova construcció del Consultori Local La Pobla de Montornès.

Pressupost d'adjudicació: 344.888,95 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 12 de juny de 2017

Data prevista de finalització: juny 2018

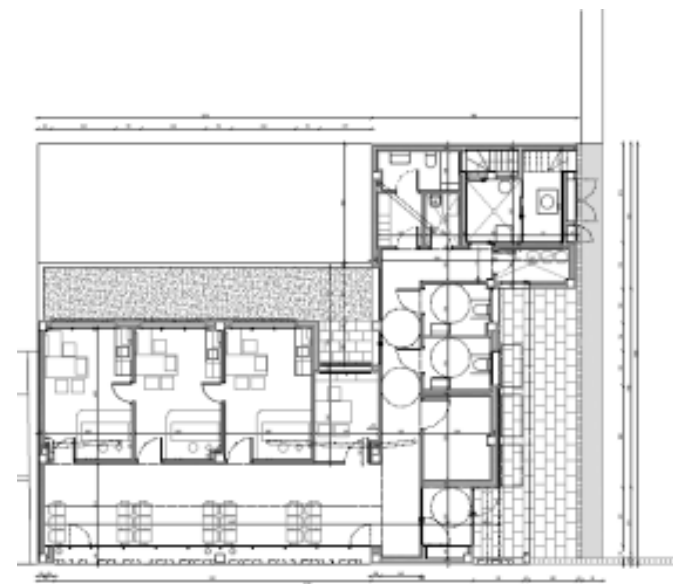

Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

2 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)
6 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 14.651.347,93 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 21 repartits en 22 projectes

Centres Judicials: (15 centres) 16 Projectes

2 projectes pendents licitació
6 projecte en licitació
1 projecte en redacció
1 projecte pendent d'aprovació
1 obra en licitació
5 obres en execució

Centres Penitenciaris: (5 centres) 5 Projectes

1 projecte en redacció
1 projecte pendent aprovació
1 obra en licitació
2 obres en execució

Centre Educatiu: 1 Projecte (1 centre)

1 obra adjudicada pendent inici



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia


2 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)
6 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Construcció d'un edifici judicial a Tortosa

Pressupost d'adjudicació: 3.977,845,80 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 9 de juny de 2017

Data prevista de finalització: febrer 2019

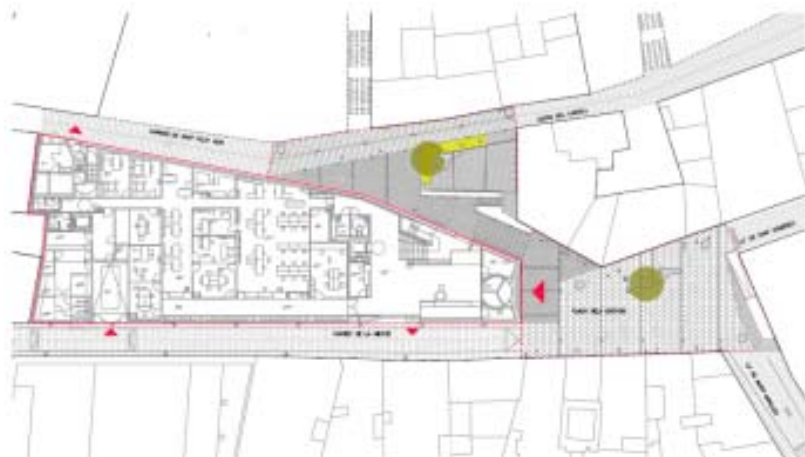

Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

2 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)

6 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra de la nova construcció de Centre Penitenciari Règim Obert 800 places Zona Franca, a Barcelona

Selecció 2^a volta per elaboració de propostes gràfiques

Pressupost de licitació: 1.802.444,00 € (IVA exclòs)



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

1 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 11.143.272,38 € (IVA exclòs)
- 33 projectes
 - 6 projectes encarregats pendent d'impuls
 - 8 projectes en licitació
 - 5 projectes en redacció
 - 2 obres en licitació
 - 1 obra en execució
 - 11 obres rebudes



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

1 Obra en execució per un import de 0,2 M €(IVA Inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 823.000,00 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 3 repartits en 3 projectes
 - 1 projecte en redacció
 - 1 obra pendent de licitació
 - 1 obra en execució



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

11 Obres en execució per un import de 41,6 M €(IVA inclòs)

Execució de les obres de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer. Fase 2. Clau: AP-01950.2

Pressupost d'adjudicació: 1.040.806,63 € (IVA exclòs)

Data inici: 6 de febrer de 2017

Data prevista de finalització: 6 d'octubre de 2017

Es continua treballant en els drenatges i s'inicia l'estesa de tot-ú en els camins. Hi ha prevista una aturada de les obres per motius mediambientals.



Actuacions en execució juny 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

11 Obres en execució a la Xarxa de regadiu Segarra-Garrigues per un import de 41,6 M €(IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (Ha)
2 obres acabades pendent recepció	2.460.755 €	-	-
Xarxa secundària al S4.1 pis B	11.706.801 €	11/04/2015 a Agost 17	581
Xarxa secundària al S12 XS05 suport arbrat de la ZEPA	4.276.323 €	16/08/2016 a Juny 17	439
Xarxa secundària al S6 ME Pis B zona NO ZEPA	6.225.643 €	16/08/2016 a Febrer 18	587
Xarxa secundària al S6 MD Pis C Preixana	3.436.517 €	29/09/2016 a Juny 17	77
Altres (2 Obres CP i 2 Electrificació)	5.452.865 €	Varis	
10 obres amb pressupost total sense IVA:	33.558.904 €		

Estació de filtres al Sector 6. TM de Verdú

Continuen les obres de xarxa de regadiu al Sector 4.1 pis B i al Sector 6 Marge Esquerra pis B a Verdú. Les obres al Marge Dret del Sector 6 pis C i les del Sector 12 de suport a l'arbrat estan pràcticament acabades i donant servei als beneficiaris. Les obres de Concentració parcel·lària a la Zona Alta del Riu Corb i les del projecte Complementari 4 també estan pràcticament acabades i continuen les dues obres d'extensió de la xarxa elèctrica en curs. Les dos obres acabades pendents de recepció són dos línies elèctriques.



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	35	115	131	1.093	9	157	3	2	178	1.367	31,79
Transports	9	118	49	1.643	14	138	2	0	74	1.899	21,43
Política Ambiental			5	0					5	0	0,26
Línia 9	3	0	13	464			2	2	18	466	1,19
ACA									0	0	
DARP											
Regadius	3	1	8	106	1	1	1	220	13	328	3,12
Camins	1	0	2	0					3	0	0,05
Edificacions	1	1							1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			5	7	4	19	2	1	11	27	
Xarxa regadiu secundària			3	26	2	44	2	4	7	74	
Concentració parcel·lària			1	1	3	1	2	4	6	6	
Total Obra Civil	52	235	217	3.340	33	360	14	233	316	4.168	57,87
Dept. Ensenyament	11	11	53	114			4	1	68	126	9,41
Servei Català de la Salut	12	14	14	37	2	1	6	59	34	111	6,48
Dept. Interior	15	6	8	5					23	11	1,65
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			4	16					4	16	0,38
Dept. Justícia	5	32	14	88	2	1			21	121	9,63
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	1	0			1	0			2	0	1,09
Altres	1	0	1	0			1	1	3	1	0,33
Total Edificació	45	63	94	260	5	2	11	61	155	386	28,97
TOTAL	97	298	311	3.600	38	362	25	294	471	4.554	86,84

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Maig 2017



Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	12	77	12	20	14	25			38	122	8
Transports	1	4	1	0	14	67			16	71	47
Política Ambiental	1	0	1	0	1	0			3	0	0
Línia 9			1	59	14	228	16	601	31	888	400
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius			1	5	1	1			2	6	1
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			2	2	4	8			6	10	3
Xarxa regadiu secundària			1	4	4	31			5	35	18
Concentració parcel·lària			2	5	2	1			4	6	1
Medi ambient					1	0			1	0	0
Total Obra Civil	14	81	21	95	55	361	16	601	106	1.138	478
Dept. Ensenyament	59	23	8	20	23	66	1	4	91	113	18
Servei Català de la Salut	2	4	4	3	11	36			17	43	21
Dept. Interior	1	0	1	1	1	4			3	5	0
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			1	0	0	0			1	0	0
Dept. Justícia	2	1	2	8	8	6			12	15	2
Dept. Vpres. Economia i Hisenda					1	14			1	14	12
Altres					16	12			16	12	6
Total Edificació	64	28	16	32	60	138	1	4	141	202	59
TOTAL	78	109	37	127	115	499	17	605	247	1.340	537

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Maig 2017

