

Informe mensual

Juliol 2017

infraestructures.cat



Seu Terres de l'Ebre

Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

15 obres de carreteres en execució per un import de 31 M €(IVA inclòs)

Reforçament del vial municipal (polígon industrial) de la carretera L-303, PK 20+120, a la carretera C-14, PK 87+970. Tram: Agramunt

Pressupost d'adjudicació: 478.682,17 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 3 de març de 2017

Data prevista de finalització: 1 de setembre de 2017

Aglomerat del vial municipal a data 30 de juny de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

15 obres de carreteres en execució per un import de 31 M €(IVA inclòs)

Implantació de barreres antiallaus. Carretera C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt Àneu

Pressupost d'adjudicació: 2.813.179,94 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 de maig de 2017

Data prevista de finalització: 7 de gener de 2018

Assaigs ancoratges, inventari barreres actuals, replanteig barreres a data 29 de juny



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

15 obres de carreteres en execució per un import de 31 M €(IVA inclòs)

Via ciclista de la BV-5301. Santa Maria de Palautordera - Estació FFCC

Pressupost d'adjudicació: 553.922,69 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 1 de juny de 2017

Data prevista de finalització: 31 de octubre de 2017

Esbrossada i replanteig d'obra a data 28 de juny



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

9 obres de FGC en execució per un import de 53 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte de perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. (Fase II)

Pressupost d'adjudicació: 50.978.072,32 € (IVA exclòs)

Inauguració prevista : 20 de juliol de 2017

Posada en servei de 3,7 Km d'infraestructura nova amb 3 estacions (La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord i una cotxera.

Amb les dues estacions inaugurades el mes de setembre passat es completa el projecte del metro de Sabadell.



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

9 obres de FGC en execució per un import de 53 M€(IVA=0)

Adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC

Pressupost d'adjudicació: 1.432.824,97 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 18 de maig de 2016

Data prevista de finalització: 10 de setembre de 2017

Execució passadís connexió PMR sota carrer Balmes a data 30 de juny de 2017

Treballs ascensor Plaça Joaquim Folguera a data 30 de juny de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

9 obres de FGC en execució per un import de 53 M€(IVA=0)

Execució de les obres del projecte d'eixamplament d'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença dels FGC

Pressupost d'adjudicació: 6.268.492,53 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 27 d'octubre de 2016

Data prevista de finalització: 26 de setembre de 2018

Finalització retirada coberta al xamfrà i estintolament de les bigues del vestíbul de Rosselló sobre puntals a data 28 de juny de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

9 obres de FGC en execució per un import de 53 M€(IVA=0)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB

Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91€ (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 d'abril de 2017

Data prevista de finalització: 24 de març de 2019

Inici d'ocupació d'obra a data 12 de juny de 2017

Inici desviaments serveis a data 3 de juliol de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament

- 15 obres en execució per un import de 59 M€(IVA inclòs)
- 8 RAM's any 2016 en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)
- 37 RAM's any 2017 en execució per un import de 4,8 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Ensenyament 2017

- Import total estimat d'execució d'obres: 8.340.000 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 82 repartits en 70 projectes
 - 1 projecte en redacció
 - 1 projecte pendent d'aprovació
 - 9 obres en licitació
 - 22 obres pendents de signatura contracte
 - 37 obres en execució

Dades a 14 de juliol de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament



15 obres en execució per un import de 59 M€(IVA inclòs)
8 RAM's any 2016 en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Institut Martí i Pous (rehabilitació antiga fàbrica Fabra i Coats) de Barcelona

Pressupost d'adjudicació: 4.829.839,00 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 3 de juliol de 2017

Data prevista de finalització: juliol 2018

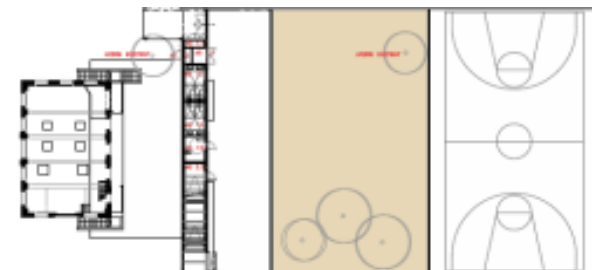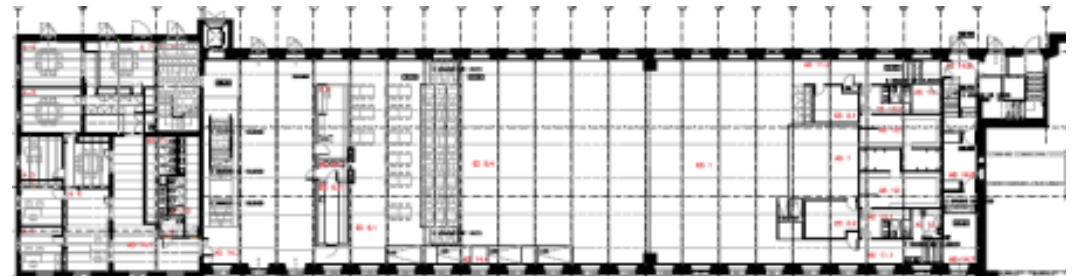

Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament



15 obres en execució per un import de 59 M€(IVA inclòs)
8 RAM's any 2016 en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Escola a Institut 2/0 Línies a l'Institut Can Periquet a Palau-Solità i Plegamans

Pressupost d'adjudicació: 1.984.517,90 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 22 de juny de 2017

Data prevista de finalització: juny 2018

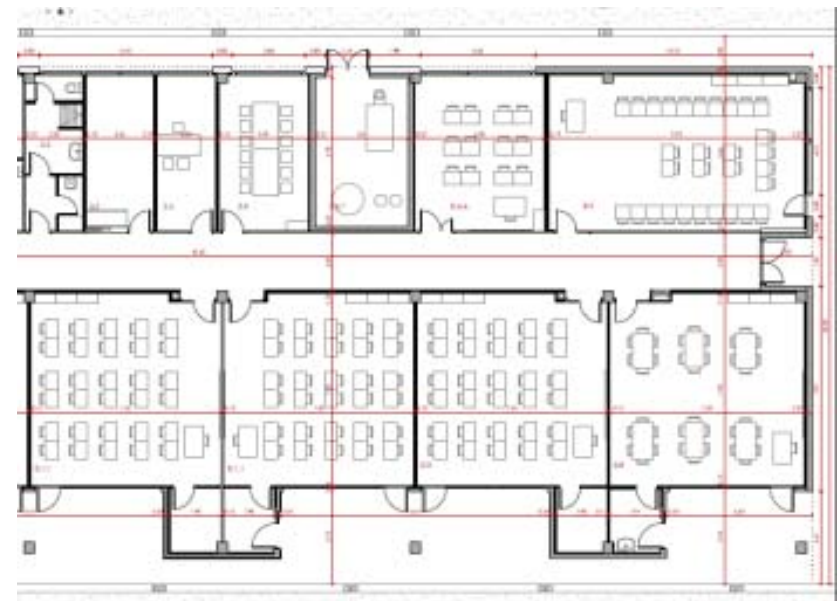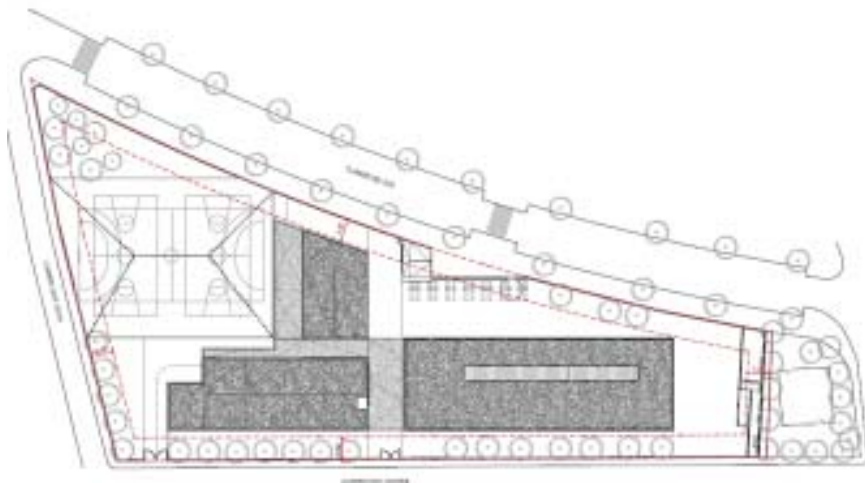

Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

10 Obres en execució per un import de 33 M€(IVA inclòs)

Nova construcció nou CAP i base comarcal del SEM a Roquetes

Pressupost d'adjudicació: 2.177.000,00 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 10 de setembre de 2015

Data de finalització: 4 de juliol de 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

3 Obra en execució per un import de 6 M€(IVA inclòs)

4 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 14.110.437,61 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 18 repartits en 19 projectes

Centres Judicials: (13 centres) 14 Projectes

- 1 projecte pendent licitació
- 3 projectes en licitació
- 3 projectes en redacció
- 1 projecte pendent d'aprovació
- 1 obra en licitació
- 5 obres en execució

Centres Penitenciaris: (4 centres) 4 Projectes

- 1 projecte en redacció
- 1 projecte pendent aprovació
- 1 obra en licitació
- 1 obra en execució

Centre Educatiu: 1 Projecte (1 centre)

- 1 obra adjudicada pendent inici



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

1 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 10.317.419,27 € (IVA exclòs)
- 29 projectes
 - 2 projectes encarregats pendent d'impuls
 - 7 projectes en licitació
 - 6 projectes en redacció
 - 3 obres en licitació
 - 11 obres rebudes



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

1 Obra en execució per un import de 0,2 M €(IVA Inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 823.000,00 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 3 repartits en 3 projectes
 - 1 projecte en redacció
 - 1 obra pendent d'adjudicació
 - 1 obra en execució



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Agència Tributària de Catalunya

14 Obres per un import de 5 M €(IVA Inclòs)

- Totes les obres acabades, pendents de subministrament elèctric, excepte Sabadell que finalitzarà a finals d'aquest mes de juliol.
- Reus i Tortosa estan pendents d'incidències amb les companyies de gas i electricitat respectivament
- La Bisbal d'Empordà
Inici previst: setembre 2017



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Agència Tributària de Catalunya

14 Obres per un import de 5 M €(IVA Inclòs)



ATC Vic



ATC Manresa



ATC Mataró



ATC Santa Coloma de Farners



ATC Granollers



ATC Sant Feliu de Llobregat



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

12 Obres en execució per un import de 46,0 M €(IVA inclòs)

Execució de les obres de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer. Fase 2. Clau: AP-01950.2

Pressupost d'adjudicació: 1.040.806,63 € (IVA exclòs)

Data inici: 6 de febrer de 2017

Data prevista de finalització: 6 d'octubre de 2017

Es preveu a final de mes una recepció parcial de les obres. S'aturarà la resta d'obra per motius mediambientals en aquelles zones que requereixen especial cura, preveient-se el seu reinici a l'octubre.



Actuacions en execució juliol 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

12 Obres en execució per un import de 46,0 M €(IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (Ha)
5 obres acabades pendent recepció	6.891.733 €	-	-
Xarxa secundària al S4.1 pis B	11.706.801 €	11/04/2015 a Agost 17	581
Xarxa secundària al S12 XS05 suport arbrat de la ZEPA	4.276.323 €	16/08/2016 a Nov 17	439
Xarxa secundària al S6 ME Pis B zona NO ZEPA	6.225.643 €	16/08/2016 a Febrer 18	587
Altres (2 Obres d'electrificació)	4.458.404 €	Varis	
10 obres amb pressupost total sense IVA:	33.558.904 €		

Estació de bombament Sector 4.1. TM Torrefeta i Florejacs

Continuen les obres de xarxa de regadiu al Sector 4.1 pis B i al Sector 6 Marge Esquerra pis B a Verdú. Les obres al Marge Dret del Sector 6 pis C i les del Sector 12 de suport a l'arbrat estan acabades, donant servei als beneficiaris, només amb plantacions pendents a realitzar la propera tardor. Les obres de Concentració parcel·lària a la Zona Alta del Riu Corb i les del projecte Complementari 4 també estan acabades i continuen les dues obres d'extensió de la xarxa elèctrica en curs. Les cinc obres acabades pendents de recepció són dues línies elèctriques, dues concentracions i una xarxa de reg.

