

Informe mensual

Desembre 2017

infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya

C-16 (Tram Berga-Bagà)

Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

26 obres de carreteres en execució per un import de 86 M €(IVA inclòs)

Millora del ferm a la C-25 entre Riudellots de la Selva i Campllong

Pressupost d'adjudicació: 1.889.761,64 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 5 de desembre de 2017

Data prevista de finalització: setembre de 2018



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

26 obres de carreteres en execució per un import de 86 M €(IVA inclòs)

Nou vial entre la C-25 i el c. Major a Riudellots de la Selva

Pressupost d'adjudicació: 146.278,04 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 27 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: maig de 2018



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

26 obres de carreteres en execució per un import de 86 M €(IVA inclòs)

Eixamplament i millora del ferm a l'L-311b a Cervera

Pressupost d'adjudicació: 899.377,92 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 16 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: 13 d'abril de 2018



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat


26 obres de carreteres en execució per un import de 86 M €(IVA inclòs)

Millora d'accessos a Alfés. C12, PK 128+300 i 129+600. Alfés

Pressupost d'adjudicació: 621.332,27 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 15 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: 15 de març de 2018

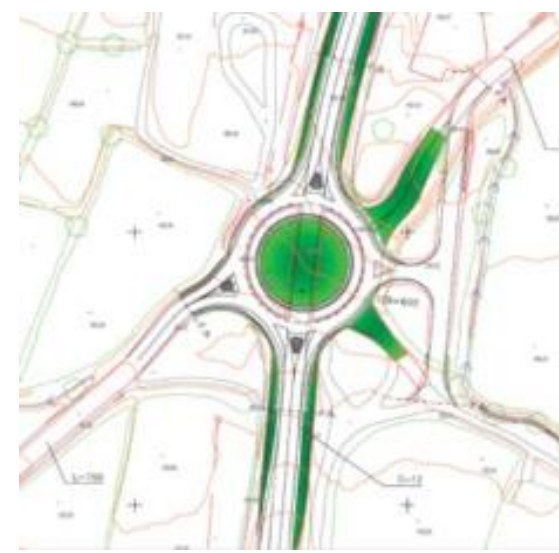

Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

26 obres de carreteres en execució per un import de 86 M €(IVA inclòs)

Reparació del tram de la C-17 entre el PK 43+050 i el PK 43+550. Tram: Centelles – Seva.

Pressupost d'adjudicació: 1.005.752,05 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 d'agost de 2017

Data prevista de finalització: 20 de gener de 2018

Finalització de les reparacions amb nova rasant i dels sistemes de contenció, a data 1 de desembre de 2017



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 5M€(IVA inclòs)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB

Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91€ (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 abril 2017

Data prevista de finalització: 24 de març de 2019

Plaça de l'Àngel. Pantalles formigonades. Treballs previs per al recrescut mòdul pantalla a data 4 de desembre de 2017

Accés Argenteria. Micropilons zona escales en execució a data 1 de desembre de 2017



Plaça de l'Àngel. Pantalles formigonades



Accés Argenteria. Micropilots zona escales en execució



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 5M€(IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte de nova estació d'autobusos de Mollerussa

Pressupost d'adjudicació: 720.785,16 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 d'abril de 2017

Data prevista de finalització: 28 de desembre de 2017

Finalització d'acabats d'arquitectura interior i exterior a data 4 de desembre de 2017



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament

16 obres en execució per un import de 71 M€(IVA inclòs)

5 RAM's any 2017 en execució per un import de 0,9 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Ensenyament 2018

- Import total estimat d'execució d'obres: 10.116.000 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 77 repartits en 32 projectes
 - 1 projecte pendent de licitació
 - 31 projectes en licitació



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

3 Obra en execució per un import de 9 M€(IVA inclòs)

3 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 12.346.969,00 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 14 repartits en 15 projectes

Centres Judicials: (11 centres) 12 Projectes

- 3 projecte pendent licitació
- 6 projectes en redacció
- 1 projecte pendent d'aprovació
- 1 obra en execució
- 1 obra en recepció

Centres Penitenciaris: (3 centres) 3 Projectes

- 1 projecte en redacció
- 1 projecte pendent aprovació
- 1 obra en execució

Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

3 Obra en execució per un import de 9 M€(IVA inclòs)

3 Obres RAM en execució per un import de 2 M€(IVA inclòs)

RAM de millora de la climatització i ventilació de l'edifici judicial de Reus

Pressupost d'adjudicació: 819.834,06 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 31 de març de 2017

Obra finalitzada pendent de recepció



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

- 1 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)
- 2 Obra RAM en execució per un import de 1 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 11.583.942,72 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
 - 3 projectes en licitació
 - 14 projectes en redacció
 - 1 projecte en aprovació
 - 2 obres en licitació
 - 2 obres en execució

Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

1 Obra en execució per un import de 0,6 M €(IVA Inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 794.717,35 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 3 repartits en 3 projectes
 - 1 projecte en aprovació
 - 1 obra pendent de licitació
 - 1 obra en execució



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

12 Obres en execució per un import de 26 M €(IVA Inclòs)

Ampliació i reforma de la 2a fase del Servei d'Urgències de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona

Pressupost d'adjudicació: 1.791.000,00 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 28 d'abril de 2015

Obra finalitzada



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

13 Obres en execució per un import de 34M €(IVA Inclòs)

Nou Centre d'Atenció Primària de Sant Pere de Ribes

Pressupost d'adjudicació: 2.190.343,68 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 4 de febrer de 2016

Obra finalitzada pendent de recepció



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

13 Obres en execució per un import de 34M €(IVA Inclòs)

Remodelació de les instal·lacions generals elèctriques de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona

Pressupost d'adjudicació: 3.931.447,08 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 21 de juliol de 2015

Obra finalitzada pendent de recepció



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Consell Català de l'Esport

2 Obres acabades pendents de recepció per un import de 8 M €(IVA Inclòs)

Nova construcció del Pavelló Poliesportiu a la zona esportiva de Camp Clar, a Tarragona. Instal·lacions

Pressupost d'adjudicació: 2.231.240,92 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 18 d'octubre de 2016

Obra finalitzada pendent de recepció



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

7 Obres en execució per un import de 19,5 M €(IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte actualitzat núm. 2 del regadiu Algerri-Balaguer. Sector C. TM de Balaguer. Clau: AR-08264.A2

Pressupost d'adjudicació: 3.883.873,77 € (IVA exclòs)

Data inici: 13 de març de 2017

Data prevista de finalització: 13 de maig de 2018

Durant aquest mes en el Pis A s'estan instal·lant les canonades i accessoris de les canonades de PEAD (polietilè de alta densitat) i s'ha realitzat amb èxit la primera prova de pressió de la canonada de PRFV (plàstic reforçat amb fibra de vidre).

En el pis B es segueix instal·lant la canonada de PRFV.



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

7 Obres en execució per un import de 19,5 M €(IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte d'obra de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer.
Fase 2. Clau: AP-01950.2

Pressupost d'adjudicació: 1.040.806,63 € (IVA exclòs)

Data inici: 6 de febrer de 2017

Data prevista de finalització: 31 de desembre de 2017

S'està executant la torre de nidificació inclosa dins de les mesures compensatòries de la DIA (Declaració Impacte ambiental) i els camins inclosos dins la zona ZEPA (Zona d'especial protecció per aus).



Actuacions en execució desembre 2017

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

7 Obres en execució per un import de 19,5 M €(IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (Ha)
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca	2.213.937 €	Novembre 17 a Maig 18	-
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó	3.493.947 €	Novembre 17 a Novembre 18	585
Xarxa secundària al S08 Espluga Calba	939.840 €	28/08/2017 a Feb. 18	85
Xarxa secundària al S06 ME Pis B zona NO ZEPA Verdú	6.225.643 €	16/08/2016 a Feb. 18	587
Linia elèctrica al S12	1.753.372 €	14/10/2015 a Des. 17	-
5 obres amb pressupost total sense IVA:	14.626.739 €		

Sector 6. Arqueta de seccionament. TM Verdú

S'han iniciat les obres de la Concentració Parcel·lària d'Arbeca i també les obres de la Xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als TTMM de Sarroca i Alcanó (XS04). Segueixen a bon ritme les obres del Sector 8 a l'Espluga Calba, i la segona fase de les obres del Sector 6 Marge esquerra a Verdú.

