

# Informe mensual

Gener 2018

infraestructures.cat



Generalitat  
de Catalunya

Variant C-13, Tram Vilanova de la Barca-Térmens

## Actuacions en execució gener 2018

**DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat**

**27 obres de carreteres en execució per un import de 89 M€(IVA inclòs)**

Implantació de barreres antiallaus. Carretera C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt Àneu

Pressupost d'adjudicació: 2.813.179,94 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 de maig de 2017

Obra suspesa temporalment 21 de desembre

Data prevista de finalització: finals estiu 2018. 60% obra executada aprox.



## Actuacions en execució gener 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

27 obres de carreteres en execució per un import de 89 M€(IVA inclòs)

Reparació del tram de la C-17 entre el PK 43+050 i el PK 43+550. Tram: Centelles – Seva

Pressupost d'adjudicació: 1.005.752,05 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 d'agost de 2017

Data de finalització: 20 de gener de 2018



## Actuacions en execució gener 2018

**DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat**

**2 obres de transports en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)**

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB


Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91€ (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 d'abril de 2017

Data prevista de finalització: 24 de març de 2019

Plaça de l'Àngel. Biga- mènsula pou ascensor formigonada a data 8 de gener de 2018

Accés Argenteria. Volta d'accés metro apuntalada. Micropilots represos a data 8 de gener de 2018

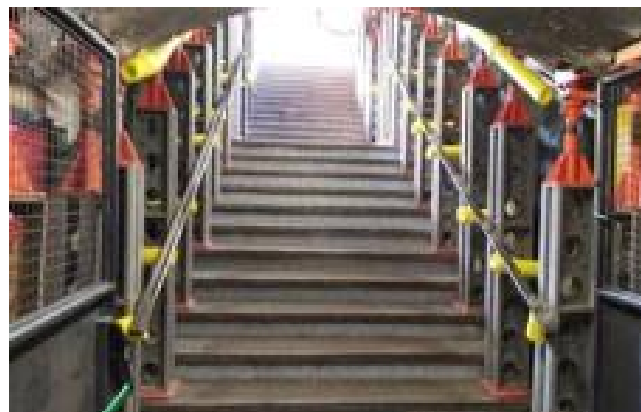

## Actuacions en execució gener 2018

### DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

**2 obres de transports en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)**

Execució de les obres del projecte de nova estació d'autobusos de Mollerussa

Pressupost d'adjudicació: 720.785,16 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 d'abril de 2017

Prova d'autobusos realitzada en data 14 de desembre de 2017

Obra finalitzada a data 29 de desembre de 2017



## Actuacions en execució gener 2018

### DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

**2 obres de transports en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)**

Execució de les obres del projecte constructiu Parada d'autobusos a Sant Joan de les Abadesses

Pressupost d'adjudicació: 197.206,97 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: 12 de març de 2018

Modificació de punts de parada provisionals a data 8 de gener de 2018



## Actuacions en execució gener 2018

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Ensenyament

**17 obres en execució per un import de 76 M€(IVA inclòs)**

**5 RAM's any 2017 en execució per un import de 1 M€(IVA inclòs)**

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Ensenyament 2018

- Import total estimat d'execució d'obres: 9.917.685,95 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 76 repartits en 32 projectes
  - 2 projectes pendent de licitació
  - 30 projectes pendents adjudicació
  - 31 obres Acord Marc en licitació



## Actuacions en execució gener 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

3 Obra en execució per un import de 9 M€(IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per un import de 1 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 12.346.969,00 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 14 repartits en 15 projectes

Centres Judicials: (11 centres) 12 Projectes

- 3 projecte pendent licitació
- 6 projectes en redacció
- 1 projecte pendent d'aprovació
- 1 obra en execució
- 1 obra en recepció

Centres Penitenciaris: (3 centres) 3 Projectes

- 1 projecte en redacció
- 1 projecte pendent aprovació
- 1 obra en execució





## Actuacions en execució gener 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

- 1 Obra en execució per un import de 4 M€(IVA inclòs)
- 2 Obra RAM en execució per un import de 1 M€(IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 11.583.942,72 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
  - 3 projectes en licitació
  - 14 projectes en redacció
  - 1 projecte en aprovació
  - 2 obres en licitació
  - 2 obres en execució



## Actuacions en execució gener 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

**1 Obra en execució per un import de 0,6 M €(IVA Inclòs)**

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 794.717,35 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 3 repartits en 3 projectes
  - 1 projecte en aprovació
  - 1 obra pendent de licitació
  - 1 obra en execució



## Actuacions en execució gener 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

15 Obres en execució per un import de 27 M €(IVA Inclòs)

Adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona

Projecte en licitació

Pressupost de licitació: 234.323,00 € (IVA exclòs)

Import estimat d'obra: 2.401.303,00 € (IVA exclòs)



## Actuacions en execució gener 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

15 Obres en execució per un import de 27 M €(IVA Inclòs)

Ampliació del Bloc quirúrgic de l'Hospital de Blanes

Projecte en licitació

Pressupost de licitació: 187.561,20 € (IVA exclòs)

Import estimat d'obra: 2.263.642,99 € (IVA exclòs)



## Actuacions en execució desembre 2017

### DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Consell Català de l'Esport

**2 Obres acabades pendents de recepció per un import de 8 M €(IVA Inclòs)**

Nova construcció del pavelló Poliesportiu a la zona esportiva de Camp Clar a Tarragona. Instal·lacions específiques pels jocs

Obra en licitació

Pressupost de licitació: 2.394.614,75 € (IVA exclòs)



## Actuacions en execució gener 2018

**DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES:** Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

**8 Obres en execució per un import de 24,3 M €(IVA inclòs)**

Execució de les obres del projecte actualitzat núm. 2 del regadiu Algerri-Balaguer. Sector C. TM de Balaguer. Clau: AR-08264.A2

Pressupost d'adjudicació: 3.883.873,77 € (IVA exclòs)

Data inici: 13 de març de 2017

Data prevista de finalització: 13 de maig de 2018

Es continua l'excavació en rasa i muntatge de canonada PRFV (plàstic reforçat amb fibra de vidre) al pis B, estesa i soldadura de tubs PEAD (polietilè de alta densitat) en els pisos A i B, inici dels treballs d'adequació del drenatge enterrat paral·lel al camí del Prat. Inici proves pressió, en trams de ramals pis A (PRFV i PEAD).



## Actuacions en execució gener 2018

**DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES:** Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

**8 Obres en execució per un import de 24,3 M €(IVA inclòs)**

Execució de les obres del projecte d'obra de concentració parcel·lària del terme municipal de Balaguer.  
Fase 2. Clau: AP-01950.2

Pressupost d'adjudicació: 1.040.806,63 € (IVA exclòs)

Data inici: 6 de febrer de 2017

Data prevista de finalització: 15 de gener de 2018

S'ha executat la torre de nidificació i la plantació de tamarius i lledoners, inclosos dins de les mesures ambientals compensatòries de la DIA (Declaració Impacte ambiental) i l'estesa i compactació de tot-ú, adequació d'accessos a finques i construcció de guals dels camins inclosos dins la zona ZEPA (Zona d'especial protecció per aus).  
Inspecció prevista 25 de gener 2018.



Informe econòmic



## Actuacions en execució gener 2018

### DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

8 Obres en execució per un import de 24,3 M €(IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (Ha)
Xarxa secundària al S06 ME Pis B zona NO ZEPA Verdú	6.225.643 €	16/08/2016 a Feb. 18	587
Xarxa secundària al S08 Espluga Calba	939.840 €	28/08/2017 a Feb. 18	85
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó	3.493.947 €	Novembre 17 a Novembre 18	267
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues	4.766.758 €	Desembre 17 a Desembre 18	420
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca	2.213.937 €	Novembre 17 a Maig 18	-
Linia elèctrica al S12	1.753.372 €	14/10/2015 a Des. 17	-
6 obres amb pressupost total sense IVA:	19.393.497 €		

S'han iniciat les obres de la xarxa de regadiu al Sector 15 del TM de Cervià de les Garrigues i continuen les obres de la concentració parcel·lària d'Arbeca, així com les obres de la xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als TTMM de Sarroca i Alcanó (XS04). Segueixen a bon ritme les obres del Sector 8 a l'Espluga Calba i la segona fase de les obres del Sector 6 Marge esquerra a Verdú.

