

Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

30 de gener de 2019

infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya

Producció Acumulada Desembre 2018

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Acumulat Desembre 2018 (1)	Pressupost Desembre 2018 (2)	Acumulat Desembre 2017(3)	Diferències producció			
				Acum. Desembre 2018 - Press. Desembre 2018 (1-2)	%	Acum. Desembre 2018 - Acum.Desembre 2017 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	40.623	48.550	32.411	-7.926	-16%	8.212	25%
DGIMT-Transports	4.082	4.129	8.755	-47	-1%	-4.673	-53%
DGPA	959	955	325	5	1%	634	195%
FGC	22.617	22.412	29.360	205	1%	-6.743	-23%
IFERCAT	57.453	60.841	75.160	-3.388	-6%	-17.708	-24%
Total Territori (*)	125.734	136.886	146.011	-11.152	-8%	-20.277	-14%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	11.517	10.055	10.514	1.462	15%	1.003	10%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.644	6.665	3.554	-21	0%	3.090	87%
Altres actuacions DARP	2.058	2.714	5.133	-655	-24%	-3.074	-60%
Total DARP	20.219	19.433	19.201	786	4%	1.018	5%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	456	3.954	616	-3.498	-88%	-160	-26%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	1.454	5.174	3.313	-3.720	-72%	-1.859	-56%
ENSENYAMENT	63.325	67.582	53.796	-4.256	-6%	9.529	18%
INTERIOR	3.582	10.278	1.219	-6.696	-65%	2.364	194%
JUSTÍCIA	5.730	7.357	8.794	-1.627	-22%	-3.063	-35%
SCS	18.113	32.970	19.475	-14.856	-45%	-1.362	-7%
Total Edificació	92.661	127.315	87.213	-34.654	-27%	5.448	6%
CCE	3.652	2.900	7.537	752	26%	-3.885	-52%
ACA	0	0	656	0	0%	-656	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	33	0	0	33	0%	33	0%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	938	0	-938	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	901	432	-901	-100%	-432	-100%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	124	874	5.784	-750	-86%	-5.660	-98%
UPC	0	0	218	0	0%	-218	-100%
Total Altres	3.809	5.613	14.627	-1.804	-32%	-10.818	-74%
Total Certificacions i Projectes	242.424	289.248	267.053	-46.824	-16%	-24.629	-9%

Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

30 obres de carreteres en execució per un import de 108 M€ (IVA inclòs)

Condicionament de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost. Túnel de Tres Ponts

Pressupost d'adjudicació: 29.256.006,625 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 7 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: novembre 2020

Inici de les voladures en totes dues boques del túnel a data 14 de gener de 2019



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB

Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 abril 2017

Data prevista de finalització: 31 de juliol de 2019

Ascensor carrer-vestíbul Plaça de l'Àngel en funcionament d'ençà el dia 20 de desembre de 2018

Vestíbul nord (C/Argenteria): execució pantalles a data 17 de gener de 2019



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524, entre el PK 3+400 i el PK 6+500. Tram: Olot (Can Blanc) - Santa Pau (Volcà Sta. Margarida)

Pressupost d'adjudicació: 541.383,27 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 de juny de 2018

Data prevista de finalització: 31 març de 2019

Finalització del moviment de terres i de la col·locació del tub per a fibra, a data 16 de gener de 2019



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de FGC en execució per un import de 28 M€ (IVA=0)

Perllongament del soterrament de la línia d'FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu (Lot 1)

Pressupost d'adjudicació: 16.941.370,66 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 3 de gener de 2018

Data prevista de finalització: 3 de març de 2019

Finalització rebliment de terres sobre la coberta de FGC i del terraplè del passeig de Can Feu a la seva nova posició planoaltimètrica a data 11 de gener de 2019



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

8 Obres en execució per un import de 15,5 M € (IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues

	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (ha)
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó	3.493.947 €	Novembre 17 a Febrer 19	267
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues	4.766.758 €	Desembre 17 a Febrer 19	420
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca	2.213.937 €	Novembre 17 a Febrer 19	-
Xarxa secundària. Sector 8. Suport olivera (ampliació)	939.840 €	Agost 18 a Febrer 19	102+35
Xarxa secundària. Complementari 5 compactació hidrants	376.511 €	Novembre 18 a Febrer 19	379
Xarxa secundària. Complementari 6 compactació hidrants	90.731 €	Novembre 18 a Febrer 19	151
Xarxa secundària S12. Millora qualitat aigua	717.193 €	Novembre 18 a Febrer 19	993
Separata obra CP al TM d'Ossó de Sió	179.838 €	Gener 19 a Febrer 19	-

Estan pràcticament acabades les obres de la Xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als TTMM de Sarroca i Alcanó, les obres de la Xarxa secundària del Sector 15 TM Cervià de les Garrigues, així com les obres de Concentració Parcel·lària d'Arbeca i l'obra del Sector 8 per ampliar-la unes 35 ha més.

Continuen les obres de compactació d'hidrants i de millora de qualitat de l'aigua. S'ha iniciat l'obra de la Separata del projecte d'obra de CP al TM d'Ossó de Sió i properament s'iniciaran les obres de Xarxa secundària al Sector 6 (etapes 2 i 3).



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 63 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Educació 2019

- Import total estimat d'execució d'obres: 10.345.168,60 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 86 repartits en 35 projectes
 - 35 projectes en licitació previsió d'adjudicació entre Consells Gener-Febrer
 - Acord Marc per a l'execució de les obres RAM 2019 en licitació previsió d'adjudicació març



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 63 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Nova construcció Institut 4/3 L Can Roca de Terrassa

Pressupost d'adjudicació: 4.383.964,92 € (IVA no inclòs)

Data d'inici: 20 de febrer de 2017

Obra acabada



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 63 M€ (IVA inclòs)


7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Nou Institut a Santa Coloma de Cervelló. Fase 1

Pressupost d'adjudicació: 1.359.224,58 € (IVA no inclòs)

Data d'inici: 7 de novembre de 2017

Ocupació per ús docent 7 de gener de 2019

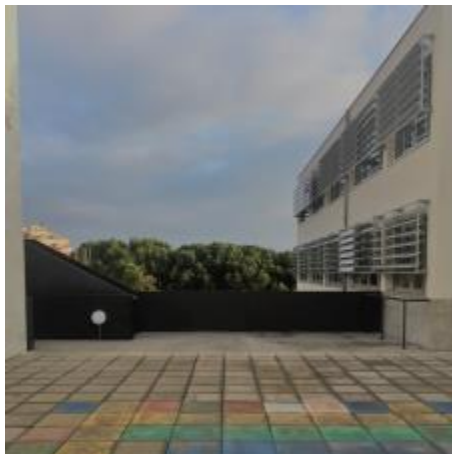

Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 63 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Obres RAM 2017, als Serveis Territorials a Girona (VI) al CEE Els Àngels de Palamós

Pressupost d'adjudicació: 235.648,28 € (IVA no inclòs)

Obra acabada i ocupada



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 63 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Obres RAM 2017 als Serveis Territorials a Girona XIII. Escola Puig i Segalar, a Viladamat

Pressupost d'adjudicació: 177.000,60 € (IVA no inclòs)

Obra acabada i ocupada



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

11 Obres en execució per un import de 66 M € (IVA Inclòs)

Projecte d'ampliació Hospital Joan XXIII de Tarragona

Pressupost licitació: 2.913.368,00 € (IVA exclòs)

Valorades les 6 propostes gràfiques presentades



Actuacions en execució gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

11 Obres en execució per un import de 66 M € (IVA Inclòs)

Nova construcció Centre de Salut a Granollers

Pressupost d'adjudicació: 9.645.695,79 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 15 de març de 2018

Termini d'execució: 22 mesos

Obra en execució. Finalitzada la contenció planta sotterrani i l'enderroc de l'edificació sota rasant existent. S'ha executat el 75% de llosa de fonamentació i s'ha iniciat l'estructura de planta sotterrani.



2 Obres en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)

1 Obra RAM en execució per import de 2 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 12.795.191,04 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 10 repartits en 11 projectes

Centres Judicials: (8 centres) 8 Projectes

5 projectes en redacció

1 projecte aprovat

1 obra en licitació

1 obra en recepció

Centres Penitenciaris: (2 centres) 3 Projectes

2 obres pendent licitació

1 obra en recepció

1 Obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 12.290.550,59 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
 - 5 projectes en redacció
 - 9 obres en licitació
 - 4 obres en execució
 - 4 obres adjudicades pendents de contracte



Actuacions en execució Gener 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

1 Obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)

Projecte obres RAM del Parc de Bombers de Balaguer. Clau: PGM-15353

Pressupost d'adjudicació redacció projecte: 47.198,80 € (IVA exclòs)

Projecte acabat



Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 713.478,05€ (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 2 repartits en 2 projectes
 - 1 obra en licitació
 - 1 obra desencarregada



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	33	112	132	1.049	2	4	5	3	172	1.168	26,30
Transports	11	177	39	1.568	12	130	5	18	67	1.893	21,55
Política Ambiental	0	0	4	1	2	1	0	0	6	2	0,21
Línia 9	1	0	19	424	0	0	4	9	24	433	1,66
ACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DARP											
Regadius	2	1	9	36	2	5	1	220	14	262	3,07
Camins	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,03
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària	0	0	6	9	3	16	0	0	9	25	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	29	4	59	0	0	7	88	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	3	3	0	0	1	1	4	4	
Total Obra Civil	49	291	217	3.120	29	218	17	252	312	3.881	52,85
Dept. Ensenyament	47	10	49	91	0	0	43	26	139	127	12,55
Servei Català de la Salut	9	63	16	13	0	0	4	5	29	81	6,93
Dept. Interior	4	9	10	5	0	0	12	8	26	22	1,96
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	1	0	3	12	0,04
Dept. Justícia	15	1	15	120	0	0	1	1	31	122	10,00
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,06
Altres	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,38
Total Edificació	76	83	93	241	1	0	61	40	231	364	31,92
TOTAL	125	374	310	3.361	30	218	78	292	543	4.245	84,77

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Desembre 2018

Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció
					Núm.	M€	Núm.	M€			Realitzada
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	10	13	20	28	30	108			60	149	29
Transports	2	5	1	2	5	34			8	41	16
Política Ambiental					1	0			1	0	0
Línia 9			1	59	10	99	15	600	26	758	345
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius									0	0	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					5	8			5	8	6
Xarxa regadiu secundària					9	37			9	37	26
Concentració parcel·lària			1	2	2	3			3	5	3
Medi ambient					3	3			3	3	2
Total Obra Civil	12	18	23	91	65	292	15	600	115	1.001	427
Dept. Ensenyament	6	13	14	8	20	66			40	87	40
Servei Català de la Salut	3	1	11	33	11	66			25	100	14
Dept. Interior	2	1	2	2	3	5			7	8	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	2	0	2	4					4	4	0
Dept. Justícia					3	10			3	10	6
Dept. Vpres. Economia i Hisenda			2	23					2	23	0
Altres	1	1	1	2	1	0			3	3	0
Total Edificació	14	16	32	72	38	147	0	0	84	235	62
TOTAL	26	34	55	163	103	439	15	600	199	1.236	489

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Desembre 2018

