



Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

27 de febrer de 2019

Producció Acumulada Gener 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Acumulat Gener 2019 (1)	Pressupost Gener 2019 (2)	Acumulat Gener 2018 (3)	Diferències producció			
				Acum. Gener 2019 - Press. Gener 2019 (1-2)	%	Acum. Gener 2019 - Acum. Gener 2018 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	2.871	5.377	2.150	-2.506	-47%	720	33%
DGIMT-Transports	246	1.310	310	-1.065	-81%	-64	-21%
DGPA	16	59	165	-43	-73%	-149	-90%
FGC	500	432	180	68	16%	320	177%
IFERCAT	1.743	2.121	2.200	-378	-18%	-457	-21%
Total Territori (*)	5.375	9.298	5.006	-3.923	-42%	369	7%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	464	621	985	-157	-25%	-521	-53%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	375	414	466	-39	-9%	-91	-20%
Altres actuacions DARP	30	517	360	-487	-94%	-330	-92%
Total DARP	869	1.552	1.812	-683	-44%	-943	-52%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	0	0	2	0	0%	-2	-100%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	0	1.084	0	-1.084	-100%	0	0%
ENSENYAMENT	1.965	3.983	3.498	-2.018	-51%	-1.533	-44%
INTERIOR	133	0	84	133	0%	49	58%
JUSTÍCIA	301	863	379	-562	-65%	-77	-20%
SCS	1.204	3.532	1.076	-2.327	-66%	129	12%
Total Edificació	3.603	9.461	5.039	-5.858	-62%	-1.435	-28%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	32	0	0	32	0%	32	0%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	52	0	-52	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	25	0	-25	-100%	0	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	60	0	0%	-60	-100%
Total Altres	32	77	60	-45	-58%	-28	-47%
Total Certificacions i Projectes	9.880	20.389	11.917	-10.509	-52%	-2.037	-17%



Projecció Anual 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions			Any 2018 (3)	Diferències producció			
Client	Projecció Any 2019 (1)	Press. Gener 2019 (2)		Proj. Any 2019 - Press. Gener 2019 (1-2)	%	Proj. Any 2019 - Any 2018 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	89.871	89.871	40.623	0	0%	49.248	121%
DGIMT-Transports	20.252	21.899	4.082	-1.647	-8%	16.170	396%
DGPA	903	981	959	-78	-8%	-56	-6%
FGC	6.989	7.221	22.617	-232	-3%	-15.629	-69%
IFERCAT	25.454	25.454	57.453	0	0%	-31.999	-56%
Total Territori	143.469	145.426	125.734	-1.957	-1%	17.734	14%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	10.385	10.385	11.517	0	0%	-1.132	-10%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.923	6.923	6.644	0	0%	280	4%
Altres actuacions DARP	4.741	8.637	2.058	-3.896	-45%	2.683	130%
Total DARP	22.049	25.946	20.219	-3.896	-15%	1.830	9%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	0	0	456	0	0%	-456	-100%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	13.926	18.111	1.454	-4.185	-23%	12.472	857%
ENSENYAMENT	59.172	66.578	63.325	-7.407	-11%	-4.154	-7%
INTERIOR	0	0	3.582	0	0%	-3.582	-100%
JUSTÍCIA	14.425	14.425	5.730	0	0%	8.695	152%
SCS	52.034	59.031	18.136	-6.997	-12%	33.897	187%
Total Edificació	139.556	158.145	92.685	-18.589	-12%	46.872	51%
CCE	0	0	3.652	0	0%	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	0	33	0	0%	-33	-100%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	0	872	0	-872	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	420	420	0	0	0%	420	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	124	0	0%	-124	-100%
Total Altres	420	1.293	3.809	-872	-67%	-3.389	-89%
Total Certificacions i Projectes	305.495	330.809	242.447	-25.315	-8%	63.048	26%



Projecció ajustada 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Projecció Ajustada Gener 2019 (1)	Any 2018 (3)	Diferències	
			Proj. Ajustada Gener 2019 - Any 2018 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	70.767	40.623	30.144	74%
DGIMT-Transports	8.278	4.082	4.196	103%
DGPA	319	959	-640	-67%
FGC	5.832	22.617	-16.785	-74%
IFERCAT	25.454	57.453	-31.999	-56%
Total Territori	110.651	125.734	-15.083	-12%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	10.385	11.517	-1.132	-10%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.923	6.644	280	4%
Altres actuacions DARP	584	2.058	-1.474	-72%
Total DARP	17.893	20.219	-2.326	-12%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.348	456	892	196%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	8.755	1.454	7.300	502%
ENSENYAMENT	35.618	63.325	-27.707	-44%
INTERIOR	7.968	3.582	4.386	122%
JUSTÍCIA	5.538	5.730	-192	-3%
SCS	29.747	18.136	11.610	64%
Total Edificació	88.973	92.685	-3.711	-4%
CCE	0	3.652	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	140	33	107	321%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	275	0	275	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	221	124	98	79%
Total Altres	636	3.809	-3.173	-83%
Total Certificacions i Projectes	218.153	242.447	-24.294	-10%



DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

30 obres de carreteres en execució per un import de 107 M€ (IVA inclòs)

Condicionament de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost. Túnel de Tres Ponts

Pressupost d'adjudicació: 29.256.006,625 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 7 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: novembre 2020

Excavació de túnel i la col·locació de sosteniment en trams des de l'embocadura sud (de PK 0+676 a 0+712) i des de l'embocadura nord (de 1+940 a 1+911). Fotografies fetes a data 7 de febrer de 2019



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

30 obres de carreteres en execució per un import de 107 M€ (IVA inclòs)

Sistemes de control per a la implantació d'un peatge tancat virtual, a diversos enllaços de l'autopista C-16 entre Terrassa i Manresa. Tram: Terrassa - Manresa

Pressupost d'adjudicació: 2.326.946,48 € (IVA exclòs) (Projecte i obra)

Data d'inici: 20 de desembre de 2016

Obra finalitzada, pla de proves finalitzat i inspecció prevista per al dia 25 de febrer de 2019



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)


Execució de les obres del projecte constructiu d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de l'FMB. FASE A

Pressupost d'adjudicació: 1.446.078,70 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 30 d'abril de 2018

Data prevista de finalització: 30 de juliol de 2019

Inici recrescut d'andana a data 14 de febrer de 2019

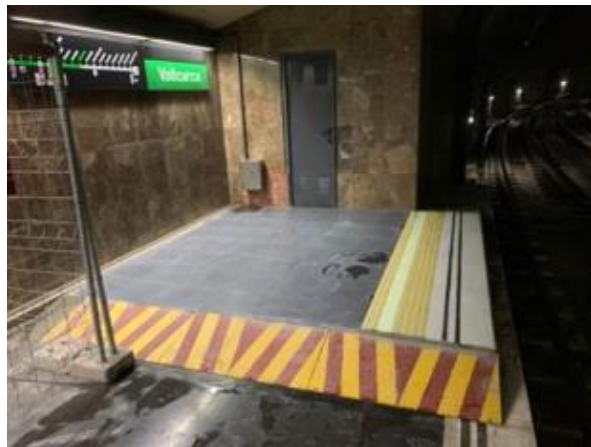

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524, entre el PK 3+400 i el PK 6+500. Tram: Olot (Can Blanc) - Santa Pau (Volcà Sta. Margarida)

Pressupost d'adjudicació: 541.383,27 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 de juny de 2018

Data prevista de finalització: 31 març de 2019

Preparació de les zones d'estada per a la col·locació de l'acer corten, a data 11 de febrer de 2019



DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de FGC en execució per un import de 25 M€ (IVA=0)

Perllongament del soterrament de la línia d'FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu (Lot 1)

Pressupost d'adjudicació: 16.941.370,66 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 3 de gener de 2018

Data prevista de finalització: 3 de març de 2019

Obertura del passeig de Can Feu i lliurament a l'Ajuntament de la superfície sobre el soterrament a data 4 de febrer de 2019



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

6 Obres en execució per un import de 14,9 M € (IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (ha)
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó	3.493.947 €	Novembre 17 a Febrer 19	267
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues	4.766.758 €	Desembre 17 a Febrer 19	420
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca	2.213.937 €	Novembre 17 a Febrer 19	-
Xarxa secundària. Sector 8. Suport olivera (ampliació)	939.840 €	Agost 18 a Febrer 19	102+35
Xarxa secundària S12. Millora qualitat aigua	717.193 €	Novembre 18 a Febrer 19	993
Separata obra CP al TM d'Ossó de Sió	179.838 €	Gener 19 a Març 19	-

Estan pendents de recepció les obres de la Xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als TTMM de Sarroca i Alcanó, les obres de la Xarxa secundària del Sector 15 TM Cervià de les Garrigues, així com les obres de Xarxa secundària del Sector 8 al TM de l'Espluga Calba.

Continuen les obres de Concentració Parcel·lària d'Arbeca, les de millora de qualitat de l'aigua al Sector 12 amb previsió d'acabar el 28 de febrer, així com l'obra de la Separata del projecte d'obra de CP al TM d'Ossó de Sió. Properament s'iniciaran les obres de Xarxa secundària al Sector 6 (etapes 2 i 3).



DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 64 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Educació 2019

➤ Import total estimat d'execució d'obres: 10.345.168,60 € (IVA exclòs)

➤ Previsió nombre total de centres: 86 repartits en 35 projectes

- 35 projectes en licitació previsió d'adjudicació entre Consells febrer-març
- Acord Marc per a l'execució de les obres RAM 2019 en licitació previsió d'adjudicació març



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 64 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Nova construcció Institut 3/2 L + 4 aules Les Aimerigues de Terrassa

Pressupost d'adjudicació: 4.155.350,74 € (IVA no inclòs)

Obra acabada pendent de recepció

Projecte fet amb metodologia BIM



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 64 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Nova construcció Institut Leonardo Da Vinci, Sant Cugat del Vallés

Pressupost d'adjudicació: 6.244.745,60 € (IVA no inclòs)

Obra inaugurada el 4 de febrer de 2019

Projecte fet amb metodologia BIM



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

13 obres en execució per un import de 64 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Ampliació i adequació Escola a Institut 2/0 Línies a l'Institut Can Periquet a Palau-Solità i Plegamans

Pressupost d'adjudicació: 1.984.517,90 € (IVA no inclòs)

Obra inaugurada el 13 de febrer de 2019



DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

2 Obres en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)
1 Obra RAM en execució per import de 2 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 12.795.191,04 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 10 repartits en 11 projectes

Centres Judicials: (8 centres) 8 Projectes

- 5 projectes en redacció
- 1 projecte aprovat
- 1 obra en licitació
- 1 obra en recepció

Centres Penitenciaris: (2 centres) 3 Projectes

- 2 obres pendent licitació
- 1 obra en recepció



DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

1 Obres en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 12.290.550,59 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
 - 5 projectes en redacció
 - 9 obres en licitació
 - 4 obres en execució
 - 4 obres adjudicades pendents de contracte



1 obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 437. 210,89 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 1 repartit en 1 projecte
 - 1 obra en licitació



1 obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Rehabilitació i reforç estructural de les plantes 1 a 4 de la residència i centre de dia per a gent gran La Mercè a Tarragona

Pressupost d'adjudicació: 3.474.033,42 € (IVA no inclòs)

Data d'inici: 06 de març de 2019

Data prevista de finalització: octubre 2020

Projecte fet amb metodologia BIM



Actuacions en execució febrer 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

1 obra en execució per un import de 7 M€ (IVA inclòs)



Distribució d'espais interiors i les seves instal·lacions per a la implantació del nou Complex Administratiu de la Generalitat de Catalunya, Fase I, a Barcelona

Pressupost d'adjudicació: 5.978.045,99 € (IVA no inclòs)

Data d'inici: 20 de febrer de 2019

Data prevista de finalització: juliol 2020

Projecte fet amb metodologia BIM

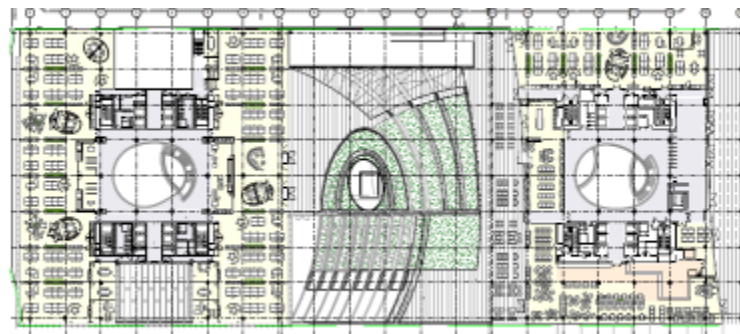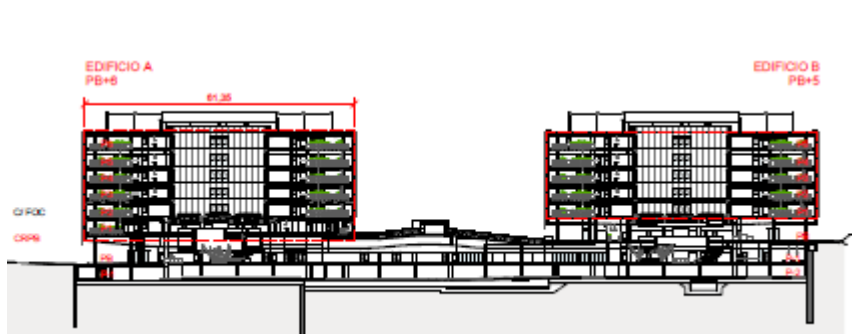

Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	33	112	131	1.049	6	27	4	2	174	1.190	26,98
Transports	12	177	38	1.567	14	132	8	20	72	1.896	21,72
Política Ambiental	0	0	4	1	2	1	0	0	6	2	0,21
Línia 9	1	0	20	424	0	0	4	9	25	433	1,66
ACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DARP											
Regadius	2	1	9	36	2	5	1	220	14	262	3,07
Camins	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,03
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària	0	0	6	9	3	16	0	0	9	25	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	29	4	59	0	0	7	88	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	
Total Obra Civil	50	291	216	3.119	35	243	18	252	319	3.905	53,70
Dept. Ensenyament	47	10	47	91	0	0	17	17	111	118	11,53
Servei Català de la Salut	10	64	15	13	0	0	5	5	30	82	6,93
Dept. Interior	4	9	10	5	0	0	12	8	26	22	1,96
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	1	0	3	12	0,04
Dept. Justícia	15	1	14	120	0	0	1	1	30	122	9,76
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,06
Altres	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,38
Total Edificació	77	84	89	241	1	0	36	31	203	356	30,66
TOTAL	127	375	305	3.360	36	243	54	283	522	4.261	84,36

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Gener 2019



Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	14	16	19	27	30	107			63	150	30
Transports	2	5	2	2	4	31			8	38	15
Política Ambiental					0	0			0	0	0
Línia 9			1	59	9	88	15	600	25	747	334
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius									0	0	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					5	8			5	8	6
Xarxa regadiu secundària					8	23			8	23	15
Concentració parcel·lària			1	2	2	3			3	5	3
Medi ambient	1	1			2	3			3	4	2
Total Obra Civil	17	22	23	90	60	263	15	600	115	975	405
Dept. Ensenyament	8	19	16	9	20	67			44	95	41
Servei Català de la Salut	2	0	10	34	13	66			25	100	15
Dept. Interior	3	1	4	4	3	5			10	10	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	1	0	2	4					3	4	0
Dept. Justícia					3	10			3	10	7
Dept. Vpres. Economia i Hisenda			2	23					2	23	0
Altres	1	1	1	2	1	0			3	3	0
Total Edificació	15	21	35	76	40	148	0	0	90	245	65
TOTAL	32	43	58	166	100	411	15	600	205	1.220	470

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Gener 2019

