

Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

27 de març de 2019

Vestíbul L10 Foneria-Foc

infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya

Producció Acumulada Febrer 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Projectes i Certificacions		Acumulat Febrer 2018 (3)	Diferències producció			
	Acumulat Febrer 2019 (1)	Pressupost Febrer 2019 (2)		Acum. Febrer 2019 - Press. Febrer 2019 (1-2)	%	Acum. Febrer 2019 - Acum.Febrer 2018 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	6.084	11.780	5.032	-5.697	-48%	1.052	21%
DGIMT-Transports	532	2.871	638	-2.339	-81%	-107	-17%
DGPA	16	129	389	-113	-88%	-373	-96%
FGC	1.130	947	789	184	19%	342	43%
IFERCAT	4.184	4.242	2.200	-58	-1%	1.984	90%
Total Territori (*)	11.946	19.968	9.048	-8.023	-40%	2.898	32%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	499	1.361	2.670	-862	-63%	-2.171	-81%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	913	908	1.202	6	1%	-289	-24%
Altres actuacions DARP	28	1.132	635	-1.105	-98%	-607	-96%
Total DARP	1.440	3.401	4.506	-1.961	-58%	-3.067	-68%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	0	0	2	0	0%	-2	-100%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	0	2.374	0	-2.374	-100%	0	0%
ENSENYAMENT	4.869	8.727	7.119	-3.858	-44%	-2.250	-32%
INTERIOR	307	0	222	307	0%	85	38%
JUSTÍCIA	1.164	1.891	1.018	-727	-38%	146	14%
SCS	2.355	7.738	3.152	-5.383	-70%	-797	-25%
Total Edificació	8.695	20.730	11.514	-12.035	-58%	-2.819	-24%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	106	0	0	106	0%	106	0%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	114	0	-114	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	55	0	-55	-100%	0	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	94	0	0%	-94	-100%
Total Altres	106	169	94	-64	-38%	12	13%
Total Certificacions i Projectes	22.186	44.269	25.162	-22.083	-50%	-2.976	-12%



Projecció Anual 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions				Diferències producció			
	Projecció Any 2019 (1)	Press. Febrer 2019 (2)	Any 2018 (3)	Proj. Any 2019 - Press. Febrer 2019 (1-2)	%	Proj. Any 2019 - Any 2018 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	89.871	89.871	40.623	0	0%	49.248	121%
DGIMT-Transports	19.889	21.899	4.082	-2.010	-9%	15.807	387%
DGPA	903	981	959	-78	-8%	-56	-6%
FGC	7.141	7.221	22.617	-80	-1%	-15.476	-68%
IFERCAT	25.454	25.454	57.453	0	0%	-31.999	-56%
Total Territori	143.258	145.426	125.734	-2.168	-1%	17.524	14%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	10.385	10.385	11.517	0	0%	-1.132	-10%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.923	6.923	6.644	0	0%	280	4%
Altres actuacions DARP	2.608	8.637	2.058	-6.029	-70%	550	27%
Total DARP	19.917	25.946	20.219	-6.029	-23%	-302	-1%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	0	0	456	0	0%	-456	-100%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	17.578	18.111	1.454	-534	-3%	16.123	1109%
ENSENYAMENT	52.942	66.578	63.325	-13.636	-20%	-10.383	-16%
INTERIOR	307	0	3.582	307	0%	-3.275	-91%
JUSTÍCIA	14.425	14.425	5.730	0	0%	8.695	152%
SCS	50.818	59.031	18.136	-8.212	-14%	32.682	180%
Total Edificació	136.070	158.145	92.685	-22.076	-14%	43.385	47%
CCE	0	0	3.652	0	0%	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	106	0	33	106	0%	72	218%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	532	872	0	-340	-39%	532	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	20	420	0	-400	-95%	20	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	124	0	0%	-124	-100%
Total Altres	658	1.293	3.809	-635	-49%	-3.151	-83%
Total Certificacions i Projectes	299.903	330.809	242.447	-30.907	-9%	57.456	24%

Projecció ajustada 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions			Any 2018 (3)	Diferències			
Client	Projecció ajustada Febrer 2019(1)	Projecció ajustada Gener 2019(1)		Proj. Febrer ajustada 2019 - Proj. Gener 2019 (1-2)	%	Proj. Ajustada Febrer 2019 - Any 2018 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	68.680	70.767	40.623	-2.087	-3%	28.057	69%
DGIMT-Transports	9.067	8.278	4.082	788	10%	4.985	122%
DGPA	313	319	959	-7	-2%	-647	-67%
FGC	5.827	5.832	22.617	-6	0%	-16.790	-74%
IFERCAT	25.454	25.454	57.453	0	0%	-31.999	-56%
Total Territori	109.340	110.651	125.734	-1.311	-1%	-16.395	-13%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	10.385	10.385	11.517	0	0%	-1.132	-10%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.923	6.923	6.644	0	0%	280	4%
Altres actuacions DARP	490	584	2.058	-94	-16%	-1.568	-76%
Total DARP	17.798	17.893	20.219	-94	-1%	-2.421	-12%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.268	1.348	456	-80	-6%	812	178%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	15.791	8.755	1.454	7.036	80%	14.336	986%
ENSENYAMENT	40.731	35.618	63.325	5.113	14%	-22.595	-36%
INTERIOR	7.885	7.968	3.582	-83	-1%	4.303	120%
JUSTÍCIA	6.191	5.538	5.730	653	12%	461	8%
SCS	29.808	29.747	18.136	61	0%	11.671	64%
Total Edificació	101.673	88.973	92.685	12.700	14%	8.988	10%
CCE	0	0	3.652	0	0%	-3.652	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	288	140	33	148	106%	255	767%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	35	275	0	-240	-87%	35	0%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	140	221	124	-82	-37%	16	13%
Total Altres	463	636	3.809	-173	-27%	-3.346	-88%
Total Certificacions i Projectes	229.274	218.153	242.447	11.121	5%	-13.173	-5%



DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

27 obres de carreteres en execució per un import de 103 M€ (IVA inclòs)

Condicionament de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost. Túnel de Tres Ponts

Pressupost d'adjudicació: 29.256.006,625 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 7 de novembre de 2017

Data prevista de finalització: novembre 2020

Aparició d'una cova càrstica al PK 0+784, en Boca Sud del túnel, que ha estat gunitada i estabilitzada estructuralment a data 8 de març de 2019



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

27 obres de carreteres en execució per un import de 103 M€ (IVA inclòs)

Millora local. Millora de nus. Rotonda a la carretera GI-652 al PK 0+800. Tram: Torrent

Pressupost d'adjudicació: 259.520,05 € (Lot 1) + 297.46,09 € (Lot 2) (IVA exclòs)

Data d'inici: 7 de maig de 2018

Data finalització: 8 de març de 2019

Finalització de les obres



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB

Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 d'abril de 2017

Data prevista de finalització: 31 de juliol de 2019

Excavació arqueològica finalitzada a data 15 de març de 2019

Enderroc de micropilons accés C/Argenteria (PMR Nord) a data 4 de març de 2019



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Via ciclista i per a vianants a la carretera GI-524, entre el PK 3+400 i el PK 6+500. Tram: Olot (Can Blanc) - Santa Pau (Volcà Sta. Margarida)

Pressupost d'adjudicació: 541.383,27 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 19 de juny de 2018

Data prevista de finalització: 31 març de 2019

Prova d'estabilització de sòl realitzada a data 8 de març de 2019

Treballs d'aglomerat i d'estesa de tot el material a estabilitzar finalitzats a data 18 de març de 2019



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de l'FMB. FASE A

Pressupost d'adjudicació: 1.446.078,70 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 30 d'abril de 2018

Data prevista de finalització: 30 de juliol de 2019

Finalització recrescut d'andana via 1 a data 15 de març de 2019



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

1 obres de FGC en execució per un import de 8 M€ (IVA=0)

Perllongament del soterrament de la línia d'FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu (Lot 1)

Pressupost d'adjudicació: 16.941.370,66 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 3 de gener de 2018

Data de finalització: 15 de març de 2019

Posada en servei sortida d'emergència dels FGC al carrer F. Lawton a data 15 de març de 2019 i finalització obra



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

4 Obres en execució per un import de 9,7 M € (IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (ha)
Xarxa secundària. Sector 6. Etapa 2 i 3 Preixana	2.372.152 €	febrer 19 a febrer 20	107
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues	4.766.758 €	desembre 17 a abril 19	420
Xarxa secundària S12. Millora qualitat aigua	717.193 €	novembre 18 a març 19	993
Separata obra CP al TM d'Ossó de Sió	179.838 €	gener 19 a abril 19	-

S'han iniciat les obres de Xarxa secundària al Sector 6 (etapes 2 i 3) i continuen les obres de la xarxa secundària al Sector 15, les obres de millora de qualitat de l'aigua al Sector 12, així com l'obra de la Separata del projecte d'obra de CP al TM d'Ossó de Sió. Properament s'iniciaran les obres de la Xarxa secundària del Sector 6. Pis B2.



DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

14 obres en execució per un import de 65 M€ (IVA inclòs)

11 obres RAM per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Educació 2019

- Import total estimat d'execució d'obres: 10.632.771,90 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 90 repartits en 37 projectes
 - 2 projectes en licitació previsió d'adjudicació entre Consells març-abril
 - 35 projectes adjudicats entre Consells febrer i març
 - Acord Marc per a l'execució de les obres RAM 2019 en licitació previsió d'adjudicació abril



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

14 obres en execució per un import de 65 M€ (IVA inclòs)

11 obres RAM per un import de 4 M€ (IVA inclòs)


Nova construcció Institut Martí i Pous (rehabilitació antiga fàbrica Fabra i Coats) de Barcelona

Pressupost d'adjudicació: 4.829.839,00 € (IVA no inclòs)

Data d'inici: 3 de juliol de 2017

Ocupació parcial 4 de març de 2019

Data prevista de recepció: maig 2019

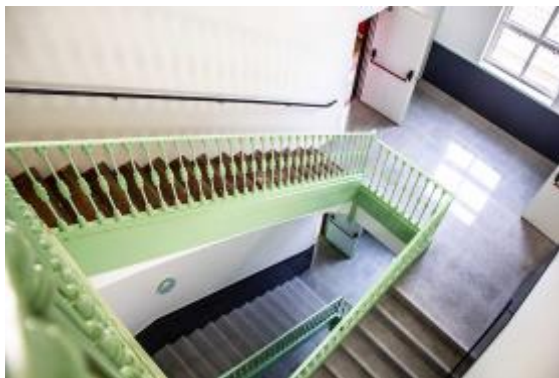

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

2 Obres en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)

1 Obra RAM en execució per import de 2 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 14.503.079,98 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 8 repartits en 9 projectes

Centres Judicials: (7 centres) 7 Projectes

5 projectes en redacció

2 obres en licitació

Centres Penitenciaris: (1 centre) 2 Projectes

2 obres pendent licitació



- 1 Obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)
- 2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 13.325.472,48 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
 - 6 projectes en redacció
 - 5 obres en licitació
 - 5 obres en execució
 - 4 obres adjudicades pendents de contracte
 - 2 obres desertes



Actuacions en execució març 2019

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

1 Obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)


Substitució del Parc de Bombers existent a Moià per un edifici de tipus industrialitzat

Pressupost d'adjudicació: 1.143.753,55 € (IVA no inclòs)

Data prevista d'inici: finals de març 2019, pendent llicència d'obres

Data prevista de finalització: març 2020

Projecte fet amb estructura de fusta

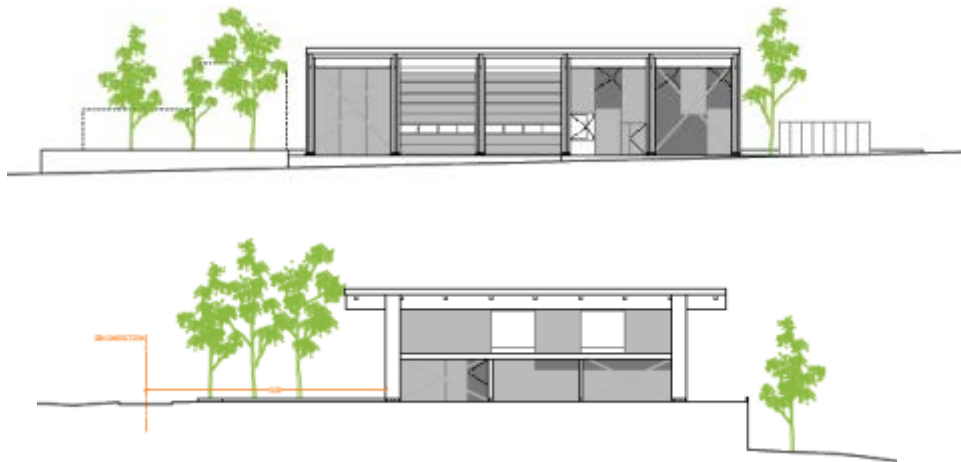

1 obra en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 437. 210,89 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 1 repartit en 1 projecte
 - 1 obra pendent d'inici




Reforma i ampliació de l'oficina de treball del SOC a Salt

Pressupost d'adjudicació: 1.321.245,28 € (IVA no inclòs)

Data prevista d'inici: finals de març de 2019 (pendent llicència d'obres)

Data prevista de finalització: setembre 2020

Projecte fet amb metodologia BIM



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	35	113	128	1.037	6	27	8	4	177	1.181	26,87
Transports	12	177	36	1.562	14	132	11	30	73	1.901	21,72
Política Ambiental	0	0	2	0	4	1	0	0	6	1	0,21
Línia 9	1	0	21	424	0	0	4	9	26	433	1,75
ACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DARP											
Regadius	2	1	9	36	2	5	1	220	14	262	3,07
Camins	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,03
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària	0	0	6	9	3	16	0	0	9	25	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	26	3	52	1	4	7	82	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	1	2	0	0	2	1	3	3	
Total Obra Civil	52	292	208	3.097	36	236	28	269	324	3.894	53,68
Dept. Ensenyament	47	10	45	91	0	0	10	9	102	110	10,54
Servei Català de la Salut	8	15	15	62	0	0	1	3	24	80	7,02
Dept. Interior	4	9	9	5	0	0	8	5	21	19	1,70
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,04
Dept. Justícia	16	1	13	120	0	0	2	2	31	123	9,78
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0,06
Altres	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,38
Total Edificació	76	35	85	290	1	0	21	19	183	344	29,52
TOTAL	128	327	293	3.387	37	236	49	288	507	4.238	83,20

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Febrer 2019


Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció
					Núm.	M€	Núm.	M€			Realitzada
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	13	15	20	28	27	103			60	146	30
Transports	2	5	1	0	4	16			7	21	10
Política Ambiental					0	0			0	0	0
Línia 9			2	59	9	88	15	600	26	747	336
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius									0	0	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					5	8			5	8	6
Xarxa regadiu secundària			1	6	6	22			7	28	15
Concentració parcel·lària			1	2	2	3			3	5	3
Medi ambient	1	1			2	3			3	4	2
Total Obra Civil	16	21	25	95	55	243	15	600	111	959	402
Dept. Ensenyament	11	27	16	15	25	69			52	111	43
Servei Català de la Salut	7	6	8	11	14	88			29	105	14
Dept. Interior	2	1	7	5	3	5			12	11	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	1	1	2	4					3	5	0
Dept. Justícia					3	10			3	10	7
Dept. Vpres. Economia i Hisenda			2	23					2	23	0
Altres	1	1	1	2	1	0			3	3	0
Total Edificació	22	36	36	60	46	172	0	0	104	268	66
TOTAL	38	57	61	155	101	415	15	600	215	1.227	468

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Febrer 2019



infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya

